



Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych **ABF-MOSTY** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Lwowska 38, 40-397 Katowice
e-mail: biuro@abf-mosty.pl

tel. +48 32 20496 51, +48 32 201 71 72-4
fax. +48 32 256 90 37 wew. 111

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 1/ŁS/2005

Dla

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.

Przebudowa mostu przez rzekę Bzurę w Łowiczu

Nr łożysk: 030/05 - 1 szt.

Zlecenie: 64020/10

1. PRODUCENT WYROBU BUDOWLANEGO:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ABF Mosty Sp. z o.o. 40-397 Katowice, ul. Lwowska 38

2. NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO:

Łożyska soczewkowe PRInż. – Katowice

3. KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA WYROBU BUDOWLANEGO:

SWW: 0621-9; PCN: 7308 10 00 0; PKWiU: 28.11.21 – 00.90

4. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBU:

Przeznaczone do stosowania w budownictwie mostowym jako łożyska podporowe przęseł mostowych.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2003-04-0439 Łożyska soczewkowe PRInż – Katowice

Wydana w Warszawie 22.07.2003r, obowiązująca do 1.08.2008r.

6. DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

Łożyska soczewkowe CJ 2 500 kN PRInż. – Katowice

Przesuw $e_x = \pm 20\text{mm}$,

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KIEROWNIK BUDOWY

Kontrola Jakości

Katowice 2005-03-1

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

INSPEKTOR W ZORU

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANymi
bez ograniczeń w specjalności Mosty
Nr 161/84/WŁ

Materiał został wbudowany na kontrakcie:
Przebudowa mostu przez rzekę Bzurę
w Łowiczu w ciągu drogi krajowej Nr 70
w km 1+203.

Kierownik Budowy

Kierownik Budowy

mgr inż. Marek Staniszewski

Zarząd: Ziemowit Markowski – Prezes Zarządu

KRS 0000043718, REGON: 271060791

NIP: 634-012-86-24



Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych **ABF-MOSTY** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Lwowska 38, 40-397 Katowice
e-mail: biuro@abf-mosty.pl

tel. +48 32 20496 51, +48 32 201 71 72-4
fax. +48 32 256 90 37 wew. 111

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 2/LS/2005

Dla

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.

Przebudowa mostu przez rzekę Bzurę w Łowiczu

Nr łożysk: 031/05, 032/05 - 2 szt.

Zlecenie: 64020/11

1. PRODUCENT WYROBU BUDOWLANEGO:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ABF Mosty Sp. z o.o. 40-397 Katowice, ul. Lwowska 38

2. NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO:

Łożyska soczewkowe PRInż. – Katowice

3. KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA WYROBU BUDOWLANEGO:

SWW: 0621-9; PCN: 7308 10 00 0; PKWiU: 28.11.21 – 00.90

4. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBU:

Przeznaczone do stosowania w budownictwie mostowym jako łożyska podporowe przęseł mostowych.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2003-04-0439 Łożyska soczewkowe PRInż – Katowice

Wydana w Warszawie 22.07.2003r, obowiązująca do 1.08.2008r.

6. DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

Łożyska soczewkowe CW 2 500 kN PRInż. – Katowice

Przesuwy $e_x = \pm 10\text{mm}$, $e_y = \pm 10\text{mm}$,

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Materiał został wbudowany na kontrakcie:
Przebudowa mostu przez rzekę Bzurę
w Łowiczu w ciągu drogi krajowej Nr 70
w km 1 + 208.

Kierownik Budowy

Katowice 2005-03-1

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Kierownik Budowy

mgr inż. Marek Stanisławski

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Janusz Opalek
UPRAWNIENIA DO NADZOROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANymi
bez ograniczeń w specjalności Mosty
Nr 161/84/04

Zarząd: Ziemowit Markowski – Prezes Zarządu
KRS 0000043718, REGON: 271060791, NIP: 634-012-86-24

PROKURATOR NADZORU
MIASTO IZ. J. Kłosa Opole
KONTAKTY DO KIEPOWANIA
ZOBOTAWI SUDOWANIMI
Z graniczen w specjalności Mosty
tel. 151/84/WE



Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych **ABF-MOSTY** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Lwowska 38, 40-397 Katowice
e-mail: biuro@abf-mosty.pl

tel. +48 32 20496 51, +48 32 201 71 72-4
fax. +48 32 256 90 37 wew. 111

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 4/LS/2005

Dla
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
Przebudowa mostu przez rzekę Bzurę w Łowiczu
Nr łożysk: 034/05 - 1 szt.
Zlecenie: 64020/13

1. PRODUCENT WYROBU BUDOWLANEGO:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ABF Mosty Sp. z o.o. 40-397 Katowice, ul. Lwowska 38

2. NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO:

Łożyska soczewkowe PRInż. – Katowice

3. KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA WYROBU BUDOWLANEGO:

SWW: 0621-9; PCN: 7308 10 00 0; PKWiU: 28.11.21 – 00.90

4. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBU:

Przeznaczone do stosowania w budownictwie mostowym jako łożyska podporowe prześł mostowych.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2003-04-0439 Łożyska soczewkowe PRInż – Katowice
Wydana w Warszawie 22.07.2003r, obowiązująca do 1.08.2008r.

6. DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

Łożyska soczewkowe CS 8 000 kN PRInż. – Katowice

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Materiał został wbudowany na kontrakcie:
Przebudowa mostu przez rzekę Bzurę
w Łowiczu w ciągu drogi krajowej Nr 70
w km 1 + 208.

Kierownik Budowy

Kontrola jakości

Katowice 2005-03-1

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Kierownik Budowy

INSPEKTOR NADZ
INŻ. Jacek Opa
UPRAWNIENIA DO KIERO
WŁADZ BUDOWLAN
bez ograniczeń w specjalności
Nr 161/84/WŁ



Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych **ABF-MOSTY** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Lwowska 38, 40-397 Katowice
e-mail: biuro@abf-mosty.pl

tel. +48 32 20496 51, +48 32 201 71 72-4
fax. +48 32 256 90 37 wew. 111

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 5/ŁS/2005

Dla

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.

Przebudowa mostu przez rzekę Bzurę w Łowiczu

Nr łożysk: 035/05 - 1 szt.

Zlecenie: 64020/14

1. PRODUCENT WYROBU BUDOWLANEGO:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ABF Mosty Sp. z o.o. 40-397 Katowice, ul. Lwowska 38

2. NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO:

Łożyska soczewkowe PRInż. – Katowice

3. KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA WYROBU BUDOWLANEGO:

SWW: 0621-9; PCN: 7308 10 00 0; PKWiU: 28.11.21 – 00.90

4. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBU:

Przeznaczone do stosowania w budownictwie mostowym jako łożyska podporowe przeseł mostowych.


5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2003-04-0439 Łożyska soczewkowe PRInż – Katowice
Wydana w Warszawie 22.07.2003r, obowiązująca do 1.08.2008r.

6. DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

Łożyska soczewkowe CW 2 500 kN PRInż. – Katowice
Przesuw $e_x = \pm 20\text{mm}$, $e_y = \pm 10\text{mm}$,

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.


Kontrola Jakości

Katowice 2005-03-1


Katowice 2005-03-1

Materiał został wbudowany na kontrakcie:
Przebudowa mostu przez rzekę Bzurę
w Łowiczu w ciągu drogi krajowej Nr 70
w km 1 + 208.

Kierownik Budowy

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Kierownik Budowy


INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Janusz Opatok
UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANymi
bez ograniczeń w specjalności IV
Nr 161/84/WŁ

Zarząd: Ziemowit Markowski – Prezes Zarządu
KRS 0000043718, REGON: 271060791, NIP: 634-012-86-24

mgr inż. Marek Stanisławski



Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych **ABF-MOSTY** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Lwowska 38, 40-397 Katowice
e-mail: biuro@abf-mosty.pl

tel. +48 32 20496 51, +48 32 201 71 72-4
fax. +48 32 256 90 37 wew. 111

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 6/LS/2005

Dla

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.

Przebudowa mostu przez rzekę Bzurę w Łowiczu

Nr łożysk: 036/05 037/05 - 2 szt.

Zlecenie: 64020/15

1. PRODUCENT WYROBU BUDOWLANEGO:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ABF Mosty Sp. z o.o. 40-397 Katowice, ul. Lwowska 38

2. NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO:

Łożyska soczewkowe PRInż. – Katowice

3. KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA WYROBU BUDOWLANEGO:

SWW: 0621-9; PCN: 7308 10 00 0; PKWiU: 28.11.21 – 00.90

4. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBU:

Przeznaczone do stosowania w budownictwie mostowym jako łożyska podporowe prześł mostowych.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2003-04-0439 Łożyska soczewkowe PRInż – Katowice

Wydana w Warszawie 22.07.2003r, obowiązująca do 1.08.2008r.

6. DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

Łożyska soczewkowe CW 8 000kN PRInż. – Katowice

Przesuwy $e_x = \pm 15\text{mm}$, $e_y = \pm 10\text{mm}$,

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KIEROWNIK BUDOWY

Kontrola Jakości

Katowice 2005-03-1

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Kierownik Budowy

Materiał został wbudowany na kontrakcie:
Przebudowa mostu przez rzekę Bzurę
w Łowiczu w ciągu drogi krajowej Nr 70
w km 1+208.

Kierownik Budowy

Zarząd: Ziemowit Markowski – Prezes Zarządu
KRS 0000043718, REGON: 271060791, NIP: 634-012-86-24

mgr inż. Marek Stanisławski

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Jacek Cebek
UPRAWNIENIA
ROBOTNIKI BUDOWLANE
bez ograniczeń w specjalności Mosty
Nr 161/84/WŁ

ABF-MOSTY ul. Lwowska 38 40-397 Katowice tel.201-71-72 w/117		Przeds.Usług Technicznych INTERCOR		WZ Wydanie materiałów na zewnątrz		Nr bieżący WZ Nr magazynu	Egz. Data 17.03.2005
Srodek transportu		Przebudowa mostu przez rz.Bzurę w Łowiczu DK nr.70		Data wysyłki		Wysyłka na koszt odbiorcy Nr i data faktury	
i.p.	Nazwa materiału / wyrobu			Ilość		Cena w zł	Wartość w zł bez VAT/
				Żadana	Jedn.		
1.	64020/10	Łożyska soczewkowe CJ 2500 kN nr.030//05			szt.	1	
2.	64020/11	Łożyska soczewkowe CW 2500 kN nr.031//05 nr.032/05			szt.	2	
3.	64020/12	Łożyska soczewkowe CW 8000 kN nr.033//05			szt.	1	
4.	64020/13	Łożyska soczewkowe CS 8000 kN nr.034//05			szt.	1	
5.	64020/14	Łożyska soczewkowe CW 2500 kN nr.035//05			szt.	1	
6.	64020/15	Łożyska soczewkowe CW 8000 kN nr.036//05 nr.037/05			szt.	2	
		Wydano Deklarację Zgodności nr.1/ ŁS/2005					
		Wydano Deklarację Zgodności nr.2/ ŁS/2005					
		Wydano Deklarację Zgodności nr.3/ ŁS/2005					
		Wydano Deklarację Zgodności nr.4/ ŁS/2005					
		Wydano Deklarację Zgodności nr.5/ ŁS/2005					
		Wydano Deklarację Zgodności nr.6/ ŁS/2005					
		Palety			szt	4	
		Kotwy fi 40x160			szt	4	
Wystawił :		Data :	Wydal :		Odebrał :		Nr przepustki :
J.Rubacha-Kepińska		17.03.2005	Zurek Kordian		Wyciek Mawzu		73/2005

Materiał został wbudowany na kontrakcie:
Przebudowa mostu przez rzekę Bzurę
w Łowiczu w ciągu drogi krajowej Nr 70
w km 1 + 208.

Kierownik Budowy

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM:

Kierownik Budowy

mgr inż. Marek Stanisławski


INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Janusz Górecki
UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANymi
bez ograniczeń w specjalności Mosty
Nr 161/84/WK

ŁOŻYSKO
JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE

NR FABRYCZNY : 030/05
TYP ŁOŻYSKA : CJ-2500 kN

PRZESUW : $ex = \pm 20$ mm

OBIEKT : Przebudowa mostu przez rzekę
Bzurę w Łowiczu w c.DK nr 70 w km 1+208
Zamawiający: PUT "INTERCOR" Sp. z o.o.




ABF®

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
ABF - MOSTY Sp. z o.o.

40-397 Katowice, ul. Lwowska 38 tel./fax: 707 59 24, 256 90 37

ŁOŻYSKO STAŁE

NR FABRYCZNY : 034/05
TYP ŁOŻYSKA : CS-8000 kN
OBIEKT : Przebudowa mostu przez rzekę
Bzurę w Łowiczu w c. DK nr 70 w km 1+208
Zamawiający: PUT "INTERCOR" Sp. z o.o.

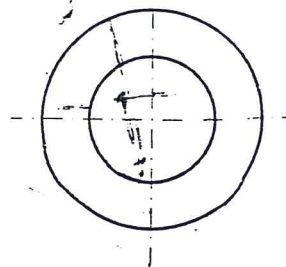

ABF®

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
ABF - MOSTY Sp. z o.o.

40-397 Katowice, ul. Lwowska 38 tel./fax: 707 59 24, 256 90 37

Materiał został wbudowany na kontrakcie:
Przebudowa mostu przez rzekę Bzurę
w Łowiczu w ciągu drogi krajowej/Nr 70
w km 1+208.

Kierownik Budowy

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Kierownik Budowy

mgr inż. Marek Stanisławski

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Janusz Dobryk
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
ROZPRACOWANIE BUDOWLANE
bez ograniczeń w specjalności Mosty
Nr 101/102

ŁOŻYSKO
WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE

NR FABRYCZNY : 035/05

TYP ŁOŻYSKA : CW-2500kN


PRZESUWY : $ex = \pm 20 \text{ mm}$

$ey = \pm 10 \text{ mm}$

Obiekt: Przebudowa mostu przez rzekę

Bzurę w Łowiczu w c. DK nr 70 w km 1+208

Zamawiający: PUT "INTERCOR" Sp. z o.o.

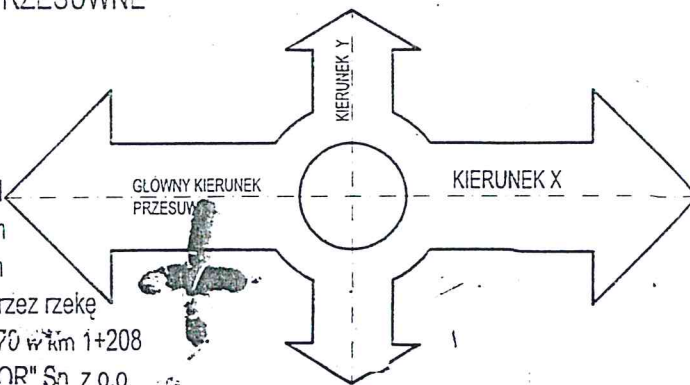

ABF®

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERSKICH
ABF - MOSTY Sp. z o.o.
40-397 Katowice, ul. Lwowska 38 tel./fax: 707 59 24, 256 90 37

ŁOŻYSKO
WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE

NR FABRYCZNY : 031/05

TYP ŁOŻYSKA : CW-2500


PRZESUWY : $ex = \pm 10 \text{ mm}$

$ey = \pm 10 \text{ mm}$

Obiekt: Przebudowa mostu przez rzekę

Bzurę w Łowiczu w c. DK nr 70 w km 1+208

Zamawiający: PUT "INTERCOR" Sp. z o.o.

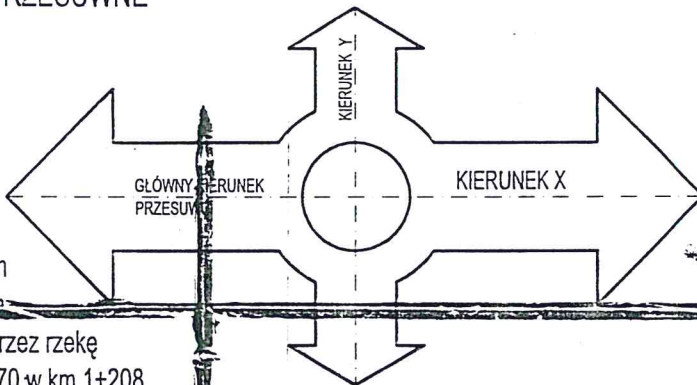

ABF®

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERSKICH
ABF - MOSTY Sp. z o.o.
40-397 Katowice, ul. Lwowska 38 tel./fax: 707 59 24, 256 90 37

Materiał został wbudowany na kontrakcie:
Przebudowa mostu przez rzekę Bzurę
w Łowiczu w ciągu drogi krajowej Nr 70
w km 1+208.

Kierownik Budowy

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Kierownik Budowy

mgr inż. Marek Staniszewski

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Janusz Opalek
UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANymi
bez ograniczeń w specjalności Mosty
Nr 161/84/WK

ŁOŻYSKO
WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE

NR FABRYCZNY : 037/05

TYP ŁOŻYSKA : CW-8000kN


PRZESUWY : $ex = \pm 15 \text{ mm}$

$ey = \pm 10 \text{ mm}$

Obiekt: Przebudowa mostu przez rzekę

Bzurę w Łowiczu w c. DK nr 70 w km 1+208

Zamawiający: PUT "INTERCOR" Sp. z o.o.

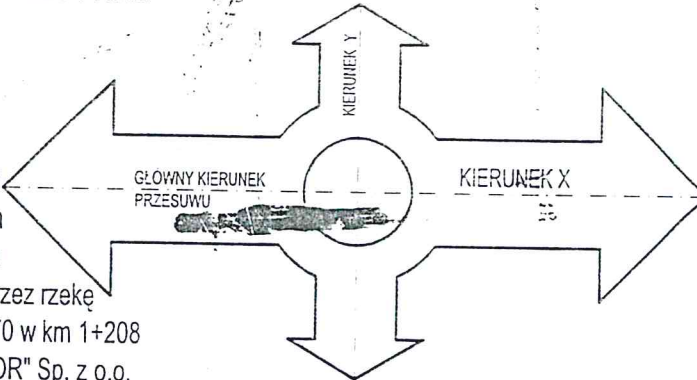

ABF®

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERSKICH
ABF - MOSTY Sp. z o.o.

40-397 Katowice, ul. Lwowska 38 tel./fax: 707 59 24, 256 90 37



ŁOŻYSKO
WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE

NR FABRYCZNY : 036/05

TYP ŁOŻYSKA : CW-8000kN


PRZESUWY : $ex = \pm 15 \text{ mm}$

$ey = \pm 10 \text{ mm}$

Obiekt: Przebudowa mostu przez rzekę

Bzurę w Łowiczu w c. DK nr 70 w km 1+208

Zamawiający: PUT "INTERCOR" Sp. z o.o.

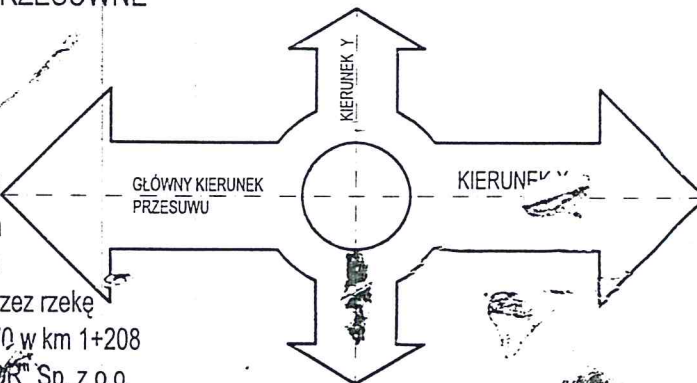

ABF®

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERSKICH
ABF - MOSTY Sp. z o.o.

40-397 Katowice, ul. Lwowska 38 tel./fax: 707 59 24, 256 90 37



Materiał został wbudowany na kontrakcie:
Przebudowa mostu przez rzekę Bzurę
w Łowiczu w ciągu drogi krajowej Nr 70
w km 1 + 208.

Kierownik Budowy

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Kierownik Budowy

mgr inż. Marek Stanczewski

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Janusz Operek
UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANymi
bez ograniczeń w specjalności mosty
Nr 151/84/VN

ŁOŻYSKO
WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE

NR FABRYCZNY : 033/05

TYP ŁOŻYSKA : CW-8000kN


PRZESUWY : $ex = \pm 10 \text{ mm}$

$ey = \pm 10 \text{ mm}$

Obiekt: Przebudowa mostu przez rzekę

Bzurę w Łowiczu w c. DK nr 70 w km 1+208

Zamawiający: PUT "INTERCOR" Sp. z o.o.

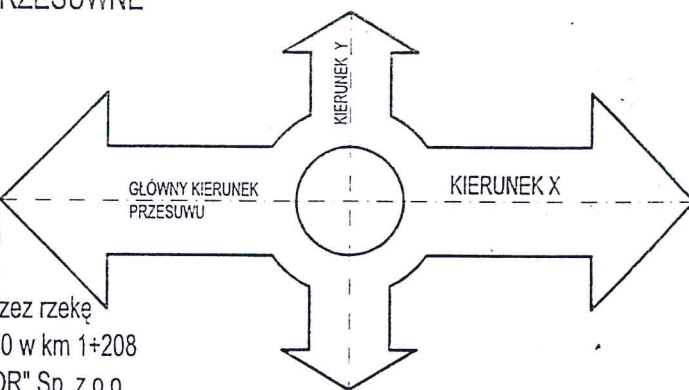

ABF®

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERSKICH

ABF - MOSTY Sp. z o.o.

40-397 Katowice, ul. Lwowska 38 tel./fax: 707 59 24, 256 90 37



ŁOŻYSKO
WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE

NR FABRYCZNY : 032/05

TYP ŁOŻYSKA : CW-2500


PRZESUWY : $ex = \pm 10 \text{ mm}$

$ey = \pm 10 \text{ mm}$

Obiekt: Przebudowa mostu przez rzekę

Bzurę w Łowiczu w c. DK nr 70 w km 1+208

Zamawiający: PUT "INTERCOR" Sp. z o.o.

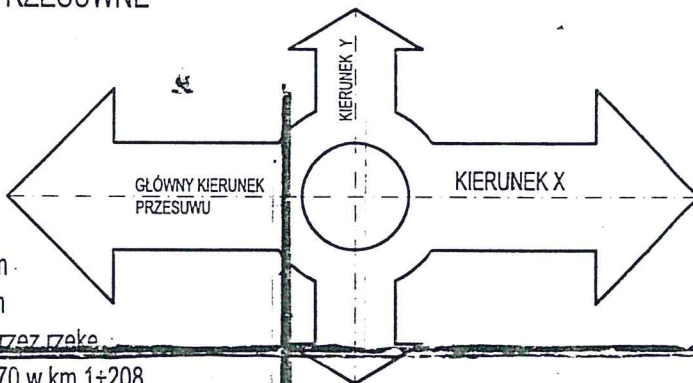

ABF®

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERSKICH

ABF - MOSTY Sp. z o.o.

40-397 Katowice, ul. Lwowska 38 tel./fax: 707 59 24, 256 90 37



Materiał został wbudowany na kontrakcie:
Przebudowa mostu przez rzekę Bzurę
w Łowiczu w ciągu drogi krajowej Nr 70
w km 1+208.

Kierownik Budowy

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Kierownik Budowy

mgr inż. Marek Stanisławski

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Janusz Górecki
UPRAWNIENIA DO ODPÓWIEDZIANIA
ROBOTAM BUDOWLANYM
bez ograniczeń w specjalności Mosty
Nr 161/64/WŁ
