

PLANOWANIE FINANSOWE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKCIE

Dominik Szymański
Departament Ochrony Wód
Warszawa, 18-19.11.2025 r.



PLAN PREZENTACJI

- 1) Budżet programu
- 2) Cel planowania / monitoringu
- 3) Dokumenty planistyczne
- 4) Rola Beneficjentów w procesie planowania
- 5) Planowanie / wykonanie wnioskowania POIiŚ 2014-2020
- 6) Rekomendacje
- 7) Efekty rzeczowe i ekologiczne
- 8) Inne sprawozdania



BUDŻET PROGRAMU

Alokacja UE:

FEnIKS

Sektor „środowisko”

Działanie 1.3



29,30 mld EUR (ok 126 mld zł)

3,7 mld EUR (ok 16 mld zł)

1,05 mld EUR (ok 4,5 mld zł)


Działanie 1.3:

Do 31.10.2025 r. zawarto **39** umów o dofinansowanie na łączną kwotę:

- 1) Koszt całkowity – **3,3 mld zł**
- 2) Wkład środków unijnych – **1,8 mld zł**



UMOWY ZAWARTE W RAMACH FENX.01.03

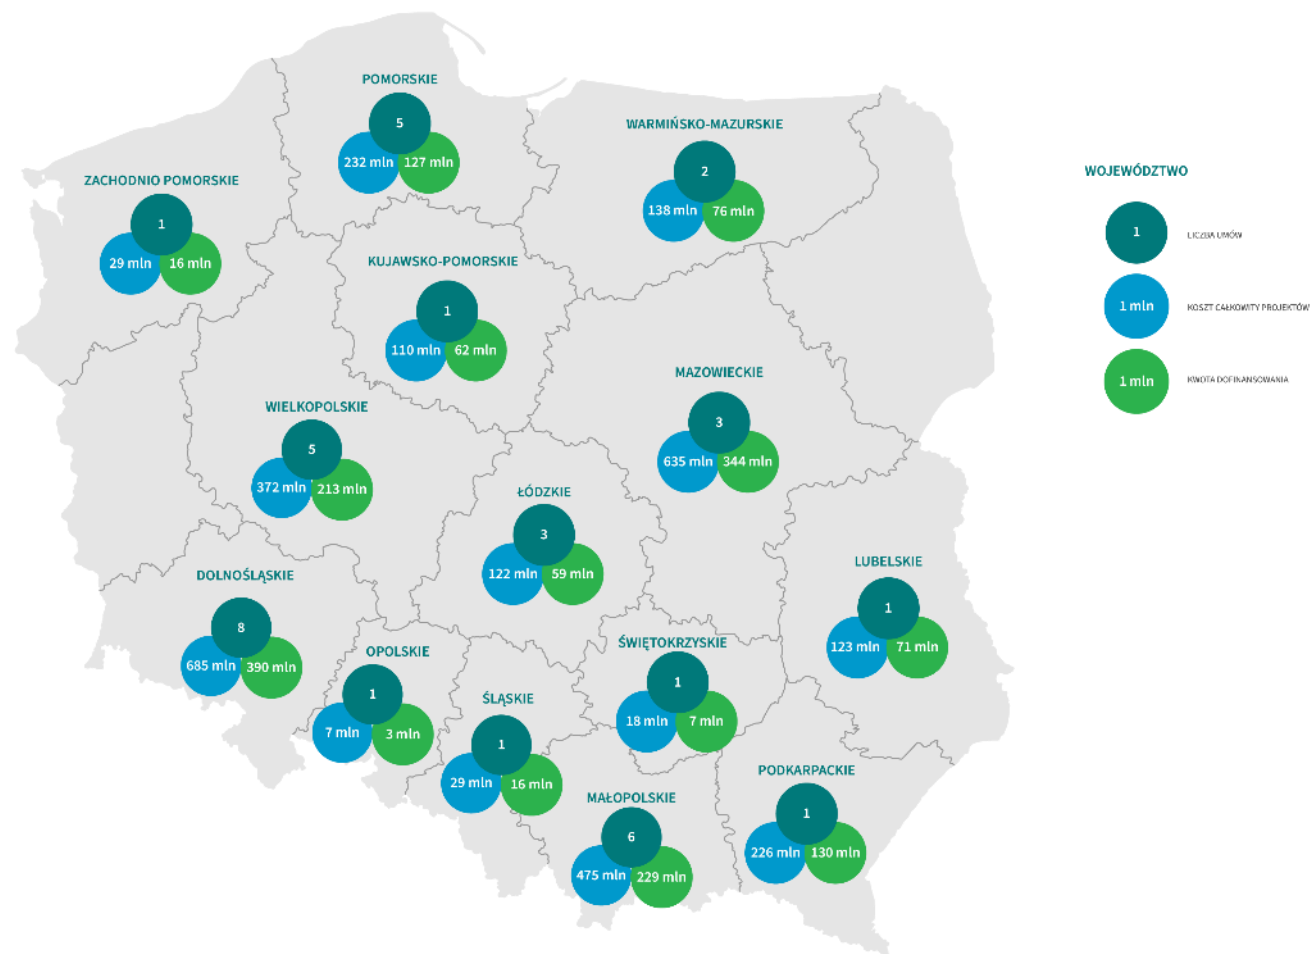

Umowy:

Podpisane umowy – 39 szt.

Wartość całkowita projektów – 3,3 mld zł

Kwota dofinansowania UE – 1,8 mld zł



Działanie FEnIKS 1.3

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

I i II nabór:

39 podpisanych umów na łączną
kwotę dofinansowania
ok. **1,8 mld zł.**

III nabór:

Trwa ocena **63 wniosków** na łączną
kwotę dofinansowania
ok. **1,7 mld zł.**

Planowane nabory

Termin: 01 grudnia 2025 r. do 31 marca 2026 r.

Budżet: 560 mln zł

CEL PLANOWANIA / MONITORINGU

Celem planowania jest:

- 1) Określenie zapotrzebowania na środki z UE
- 2) Określenie certyfikacji środków UE

Celem monitoringu jest:

- 1) Porównanie planu z realizacją
- 2) Reagowanie na odchylenia
- 3) Podejmowanie działań naprawczych





DOKUMENTY PLANISTYCZNE

1) Plan wnioskowania o środki UE i aktualizacje

(zał. 4 do UoD - Harmonogram Płatności):

- ☐ na 31 marca
- ☐ na 30 września

2) Plan certyfikacji środków UE

(moduł Harmonogram płatności w systemie CST2021)

- ☐ składany w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia Umowy
- ☐ Aktualizacja razem z aktualizacją Załączników do UoD
oraz na wezwanie IW w razie potrzeby



ROLA BENEFICJENTÓW W PROCESIE PLANOWANIA (1/3)

1) Planowanie wnioskowania o środki UE:

- ☐ Płatności zaliczkowe
- ☐ Płatności pośrednie
- ☐ Płatności końcowe

2) Planowanie certyfikacji środków UE:

- ☐ Rozliczenie zaliczki (faktury)
- ☐ Refundacja tj. płatności pośrednie i końcowe (faktury)

A low-angle photograph of a forest with tall trees and bright sunlight filtering through the green leaves.

ROLA BENEFICJENTÓW W PROCESIE PLANOWANIA (2/3)

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w okresie programowania 2021-2027 każdy z realizowanych programów operacyjnych, pod rygorem anulowania przez KE części z podjętych zobowiązań, musi w poszczególnych latach osiągnąć określony poziom certyfikacji

Brak realizacji założonych wielkości może doprowadzić do **anulowania** jeszcze **nierozliczonego dofinansowania w ramach umów zawartych z beneficjentami**

Z tej przyczyny stopień realizacji zadanych limitów tj. prognozowane poziomy **certyfikacji (w szczególności w latach 2025-2027)**, będą podlegać stałemu i bardzo uważnemu monitoringowi przez IP i IZ FEnIKS


ROLA BENEFICJENTÓW W PROCESIE PLANOWANIA (3/3)

W kontekście zasad obowiązujących w okresie programowania 2021-2027, w odniesieniu do poszczególnych projektów szczególnego znaczenia nabiera:

- ☐ rzetelne prognozowanie ponoszonych wydatków kwalifikowanych (wymóg zapisany w § 8 ust. 11 UoD), w szczególności w harmonogramach projektu stanowiących zał. 3 i 4, do Umowy o dofinansowanie
- ☐ terminowa realizacja powyższych prognoz (wymóg zapisany w § 8 ust. 9 UoD – dot. **aktualizacji Harmonogramu Płatności**) i postępujące wraz z nią składanie poprawnie sporządzonych wniosków o płatność obejmujących wydatki kwalifikowane w odpowiedniej wysokości

PLANOWANIE / WYKONANIE WNIOSKOWANIA POIŚ 2007-2013 I 2014-2020

Realizacja planu w okresie 3 pierwszych lat

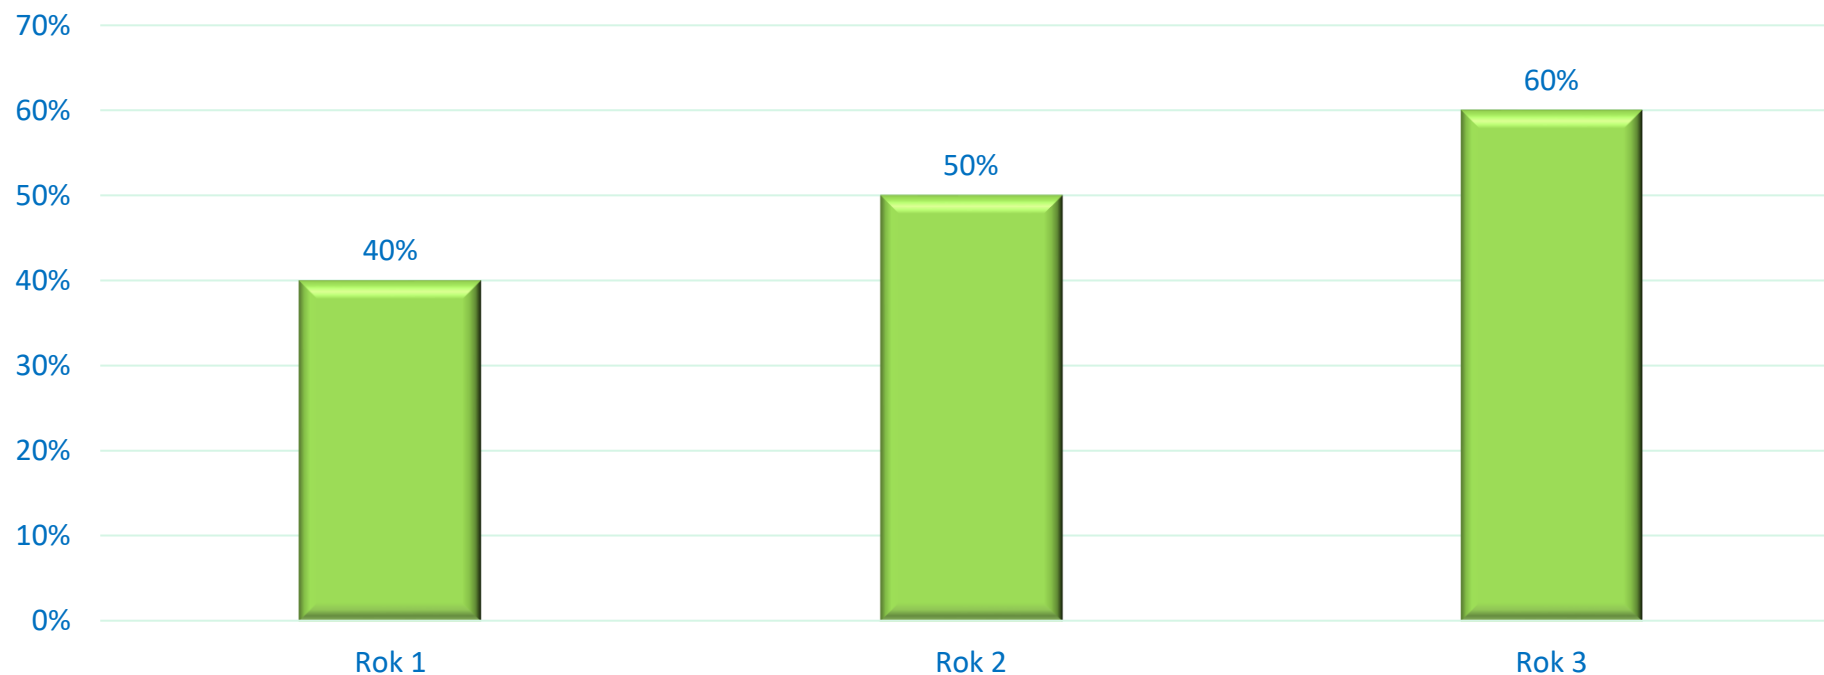



REKOMENDACJE (1/2)

Rzetelne planowanie zapotrzebowania na środki UE

oparte na aktualnych i zweryfikowanych / autoryzowanych przez beneficjentów harmonogramach realizacji projektu

Terminowe zmiany harmonogramów płatności

każdorazowe uzasadnienie zmian + wskazanie kwot i terminów wypłat zaległych

CST2021

bieżąca aktualizacja danych w systemie

REKOMENDACJE (2/2)

W celu zapewnienia jak najlepszego prognozowania oraz wykonania planu w zakresie certyfikacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o:

- ☐ Zapewnienie jak najlepszej jakości przedkładanych wniosków o płatność oraz realnego prognozowania ponoszonych wydatków
- ☐ Realizację założeń uzgodnionych załączników do umowy o dofinansowanie, a w szczególności zminimalizowanie ryzyka wystąpienia opóźnień mających wpływ na moment i wielkość ponoszonych wydatków kwalifikowanych

Efekty rzeczowe i ekologiczne

Efektami rzeczowymi i ekologicznymi z podpisanych do 31.10.2025 r. umów o dofinansowanie będą m.in.:



Sieć kanalizacyjna

W ramach wszystkich inwestycji zostaną wybudowanych i zmodernizowanych 296 km sieci kanalizacyjnej

296 km



Oczyszczalnie ścieków

W ramach inwestycji zostaną wybudowane i zmodernizowane 23 oczyszczalnie ścieków

23 szt.



Podłączenie ludności

Inwestycje pozwolą na podłączenie ponad 35 tys. osób do zbiorczej kanalizacji sanitarnej i systemu oczyszczania ścieków.

35 tys. osób



Wielkość ładunku

Projekty pozwolą na prawidłowe usunięcie ładunku ze ścieków pochodzących od ok. 1 514 tys. równoważnej liczby mieszkańców (RLM)

1 514 tys. RLM

Inne sprawozdania



Wojewódzki Konserwator
Zabytków



Wykaz podmiotów w
sprawie powierzenia
przetwarzania danych
osobowych



Monitorowanie
przygotowania projektów
wybieranych do
dofinansowania w sposób
niekonkurencyjny



Wykaz projektów
podlegających nadzorowi
budowlanemu WINB/GINB



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

www.nfosigw.gov.pl



**NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ**
