

Zakres prac nad projektem PZO i proces tworzenia

I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy
Narew

30 czerwca 2025 r.

Michał Korniluk – Koordynator prac OSO

Filip Jarzombkowski - Koordynator prac SOO



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko




Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Proces planistyczny prowadzący do sporządzania projektu

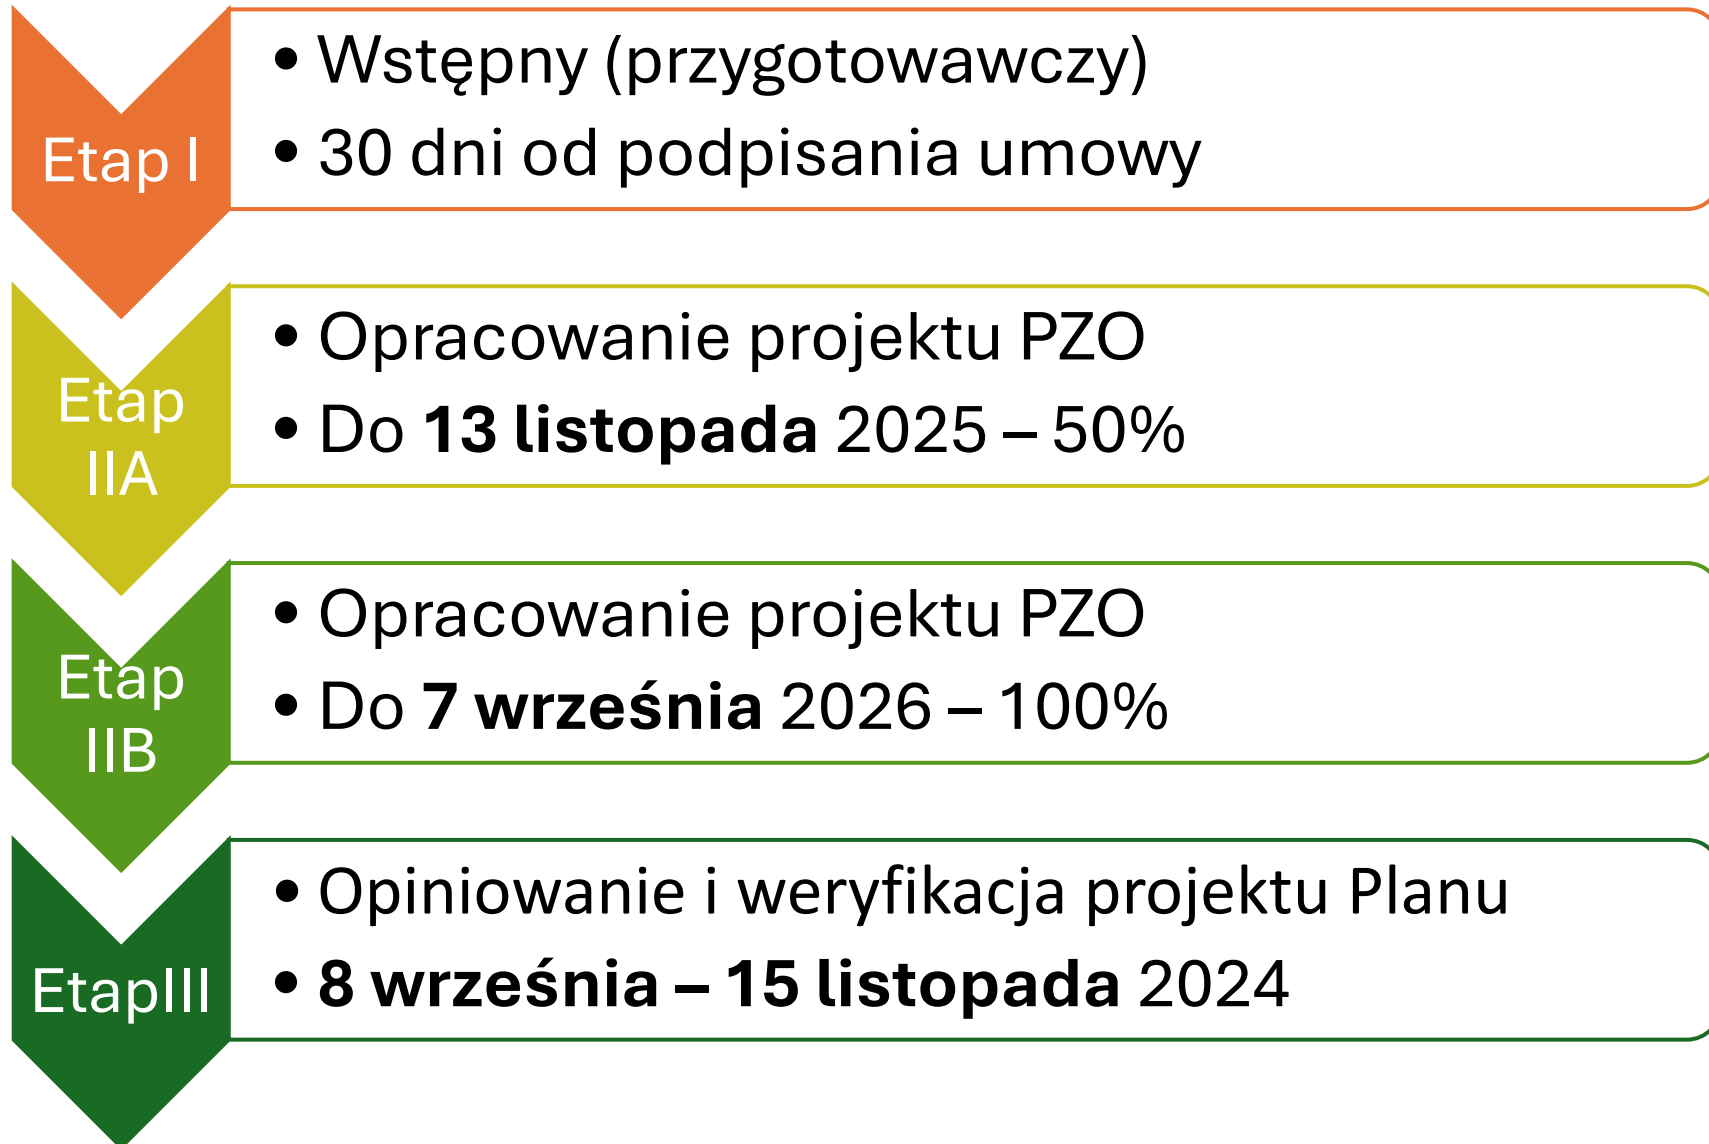

Proces planistyczny prowadzący do sporządzania projektu

ETAP I - do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

1. Weryfikacja terenu objętego projektem Planu;
2. Ustalenie przedmiotów ochrony obszaru objętych projektem Planu;
- 3. Opracowanie opisu założeń do sporządzenia projektu Planu:**
 - zwięzły opis obszaru Natura 2000
 - wyszczególnienie aktualnych przedmiotów ochrony obszaru
 - ustalenie, czy są części obszaru Natura 2000 nieobjęte projektem Planu
 - krótkie wyjaśnienie, czym jest plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
 - zapowiedź planowanych spotkań dyskusyjnych.
4. Organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu;
5. Utworzenie Zespołu Lokalnej współpracy (ZLW).

Proces planistyczny prowadzący do sporządzania projektu

ETAP II – 50% do 13 listopada 2025 r. oraz 50% do 7.09.2026 r.

1. Wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000
2. Zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach ochrony.
3. Weryfikacja statusu przedmiotów ochrony.
4. **Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony.**
5. **Identyfikacja i analiza zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu ochrony.**
6. **Ustalenie celów działań ochronnych.**
7. **Określenie działań ochronnych zmierzających do utrzymania bądź przywrócenia „właściwego stanu ochrony” oraz ograniczenia/eliminacji zagrożeń.**
8. Ustalenie niezbędnych wskazań do studiów i planów.
9. Zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic.
10. Ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony.
11. Przekazanie skonsultowanej z ZLW dokumentacji projektu Planu wraz z projektem zarządzenia, celem wyłożenia projektu Planu do konsultacji społecznych.

Zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach ochrony

- Aktualny Standardowy Formularz Danych (SDF) obszaru Natura 2000;
- Mapy obszarów Natura 2000 dostępne na stronie internetowej GDOŚ;
- Wyniki badań i opracowań wykonanych dla danego obszaru Natura 2000, przekazanych przez RDOŚ;
- Podręczniki metodyczne dla monitoringu ptaków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) GIOŚ;
- Materiały zgromadzone podczas pracy nad projektem Planu przez zespół wykonawców;
- Literatura naukowa, dane niepublikowane o przedmiotach ochrony obszaru i metodach ich ochrony;
- Dane z projektów ochrony czynnej, ARiMR, KOWR;
- Konsultacje ze społecznością lokalną, ekspertami, naukowcami.

Działania ochronne

- Rodzaj działań ochronnych;
- Zakres prac przewidzianych do realizacji ze wskazaniem technicznych uwarunkowań realizacji działania;
- Obszar realizacji działań ochronnych z podaniem numerów działek ewidencyjnych lub poligonów;
- Termin oraz częstotliwość realizacji;
- Podmioty odpowiedzialne za wykonanie;
- Oszacowanie kosztów realizacji działań z podaniem szczegółowej kalkulacji;
- Podmioty, których współdziałanie przy realizacji działań ochronnych jest niezbędne;
- Obligatoryjność lub fakultatywność działania, uwzględniając konieczność osiągnięcia celów ochrony obszaru – dotyczy działań ochronnych prowadzonych na terenach rolniczych, za realizację których zapewnione jest finansowanie ze środków UE w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich;
- Działania w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony.

Proces planistyczny prowadzący do sporządzania projektu

ETAP 3 - Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu –
8 września - 15 listopada 2026 r.

- 1. Konsultacje społeczne – 21 dni.**
2. Ustosunkowywanie się do uwag i wniosków zgłaszanych przez członków ZLW oraz innych interesariuszy;
3. Uwzględnienie uwag RDOŚ, GDOŚ i innych instytucji państwowych;
4. Wprowadzenie poprawek w oparciu o uwagi zgłoszone podczas konsultacji.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Spotkania ZLW – Zapraszamy ponownie!

II spotkanie ZLW – 15 grudnia
