

# Untitled Gantt Project

2020-08-07

<http://>

Kierownik projektu

Daty projektu

2020-04-20 - 2020-06-23

% Wykonania

0%

Zadania

42

Osoby

25

## Zadania

2

Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
szablon harmonogramu szczegółowego GanttProject	20-04-20	20-06-22
Etap / sekcja 1	20-04-20	20-05-12
<i>Warto "kolorować" harmonogram i używać kolorowych czcionek dla zwiększenia przejrzystości</i>		
Obszar 1	20-04-20	20-04-30
<i>W kolumnie "Nazwa zadania" - podzadania można "zwijać" klikając na "trójkącik" po lewej</i>		
Podobszar 1	20-04-20	20-04-27
<i>Zadania zrealizowane można "zwijać" i zapisać harmonogram w takiej formie aby skupiać się jedynie na zadaniach w trakcie realizacji</i>		
Zadanie 1	20-04-20	20-04-22
Zadanie 2	20-04-23	20-04-24
<i>Jeżeli po cyfrach nie ma relacji w kolumnie "Poprzedniki" - to znaczy że relacja domyślna to ZR</i>		
Zadanie 3	20-04-27	20-04-27
<i>Jeżeli po cyfrach nie ma relacji w kolumnie "Poprzedniki" - to znaczy że relacja domyślna to ZR</i>		
Podobszar 2	20-04-27	20-04-30
Zadanie 1	20-04-27	20-04-28
<i>Zastosowano relację RR</i>		
Zadanie 2	20-04-29	20-04-30
KM: Zadanie 3 (np. akceptacja dyrektora działu IT)	20-05-01	20-05-01
<i>Kamień milowy - punkt kontrolny. Zadanie na ścieżce krytycznej projektu; KM to kluczowe zadanie do zrealizowania w ramach projektu bez którego realizacji projekt nie będzie mógł być dalej realizowany</i>		
Obszar 2	20-04-23	20-05-12
<i>Obszar to sekcja zadań tematycznych do zrealizowania w ramach jednego zagadnienia</i>		
Podobszar 1	20-04-23	20-05-12
<i>Podobszar to mniejsze zagadnienie składające się na obszar</i>		
Zadanie 1	20-04-23	20-04-30
<i>Zastosowano relację ZZ</i>		
Zadanie 2	20-05-01	20-05-07
<i>Zadanie to konkretna czynność do zrealizowania w ramach projektu</i>		
Zadanie 3	20-05-08	20-05-12
Podobszar 2	20-05-06	20-05-11
Zadanie 1	20-05-06	20-05-07
<i>Zastosowano relację RZ</i>		
Zadanie 2	20-05-08	20-05-11

## Zadania

3

Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
<b>KM: Zadanie 3 (np. akceptacja dyrektora działu marketingu)</b> <i>Kamień milowy - punkt kontrolny. Zadanie na ścieżce krytycznej projektu - ścieżka krytyczna zbudowana jest z KM czyli z kluczowych (najważniejszych) zadań do zrealizowania w ramach projektu</i>	20-05-12	20-05-12
<b>Etap / sekcja 2</b> <i>Proponowana kolejność grupowania zadań: Etap / sekcja &gt; Obszar &gt; Podobszar &gt; Zadania</i>	20-05-12	20-06-22
<b>Obszar 1</b>	20-05-12	20-06-05
Podobszar 1	20-05-12	20-05-25
Zadanie 1	20-05-12	20-05-14
Zadanie 2	20-05-15	20-05-20
Zadanie 3	20-05-21	20-05-25
Podobszar 2	20-05-26	20-06-05
Zadanie 1	20-05-26	20-05-28
Zadanie 2	20-05-29	20-06-05
<b>KM: Zadanie 3 (np. akceptacja pani dyrektor działu prawnego)</b> <i>Kamień milowy - punkt kontrolny. Zadanie na ścieżce krytycznej projektu; punkt kontrolny nie zawsze jest KM - może być po prostu punktem kontrolnym na podstawie którego kierownik projektu ocenia postęp projektu</i>	20-06-08	20-06-08
<b>Obszar 2</b>	20-06-05	20-06-22
Podobszar 1	20-06-08	20-06-12
Zadanie 1	20-06-08	20-06-08
Zadanie 2	20-06-09	20-06-10
Zadanie 3	20-06-11	20-06-12
Podobszar 2	20-06-05	20-06-22
Zadanie 1	20-06-15	20-06-17
Zadanie 2	20-06-18	20-06-22
<b>KM: Zadanie 3 (np. zgodna na wdrożenie produkcyjne udzielona przez członka zarządu)</b> <i>Kamień milowy - punkt kontrolny. Zadanie na ścieżce krytycznej projektu; KM z niniejszego harmonogramu powinien być zmapowany (pokrywać się) z KM zawartymi w harmonogramie zawierającym KM z wniosku o dofinansowanie</i>	20-06-23	20-06-23
<i>Więcej o relacjach między zadaniami w programie MS Project:</i>	20-06-05	20-06-08
<a href="https://support.office.com/pl-pl/article/%C5%81%C4%85czenie-zada%C5%84-w-projekcie-31b918ce-4b71-475c-9d6b-0ee501b4be57#types">https://support.office.com/pl-pl/article/%C5%81%C4%85czenie-zada%C5%84-w-projekcie-31b918ce-4b71-475c-9d6b-0ee501b4be57#types</a>	20-06-05	20-06-08

Zadania

Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
<i>Niniejszy harmonogram służy do operacyjnego prowadzenia projektu dzień po dniu (narzędzie dla kierownika projektu); nie jest to kolejny harmonogram który należy przedstawiać instytucjom finansującym projekt</i>	20-06-05	20-06-08

Osoby

Osoba	Domyślna rola
Jan Kowalski	niezdefiniowany
Tomasz Nowak	niezdefiniowany
Łukasz Zieliński	niezdefiniowany
John Doe	niezdefiniowany
Marek Kowalski	niezdefiniowany
Jarek Nowak	niezdefiniowany
Adam Kowalik	niezdefiniowany
Dawid Mielesz	niezdefiniowany
Jan Długosz	niezdefiniowany
Adam Mickiewicz	niezdefiniowany
Stefan Niecik	niezdefiniowany
John Smith	niezdefiniowany
Daniel Juszczuk	niezdefiniowany
Antek Kleks	niezdefiniowany
Witold Jaroszewski	niezdefiniowany
Natalia Kruk	niezdefiniowany
Wiesław Nalazek	niezdefiniowany
Czesław Niemen	niezdefiniowany
Grzegorz Wątyły	niezdefiniowany
Tomasz Czech	niezdefiniowany
Jan Kulczyk	niezdefiniowany
Marta Caban	niezdefiniowany
Jonasz Mielec	niezdefiniowany
Jan Kuc	niezdefiniowany

Wykres Gantt'a

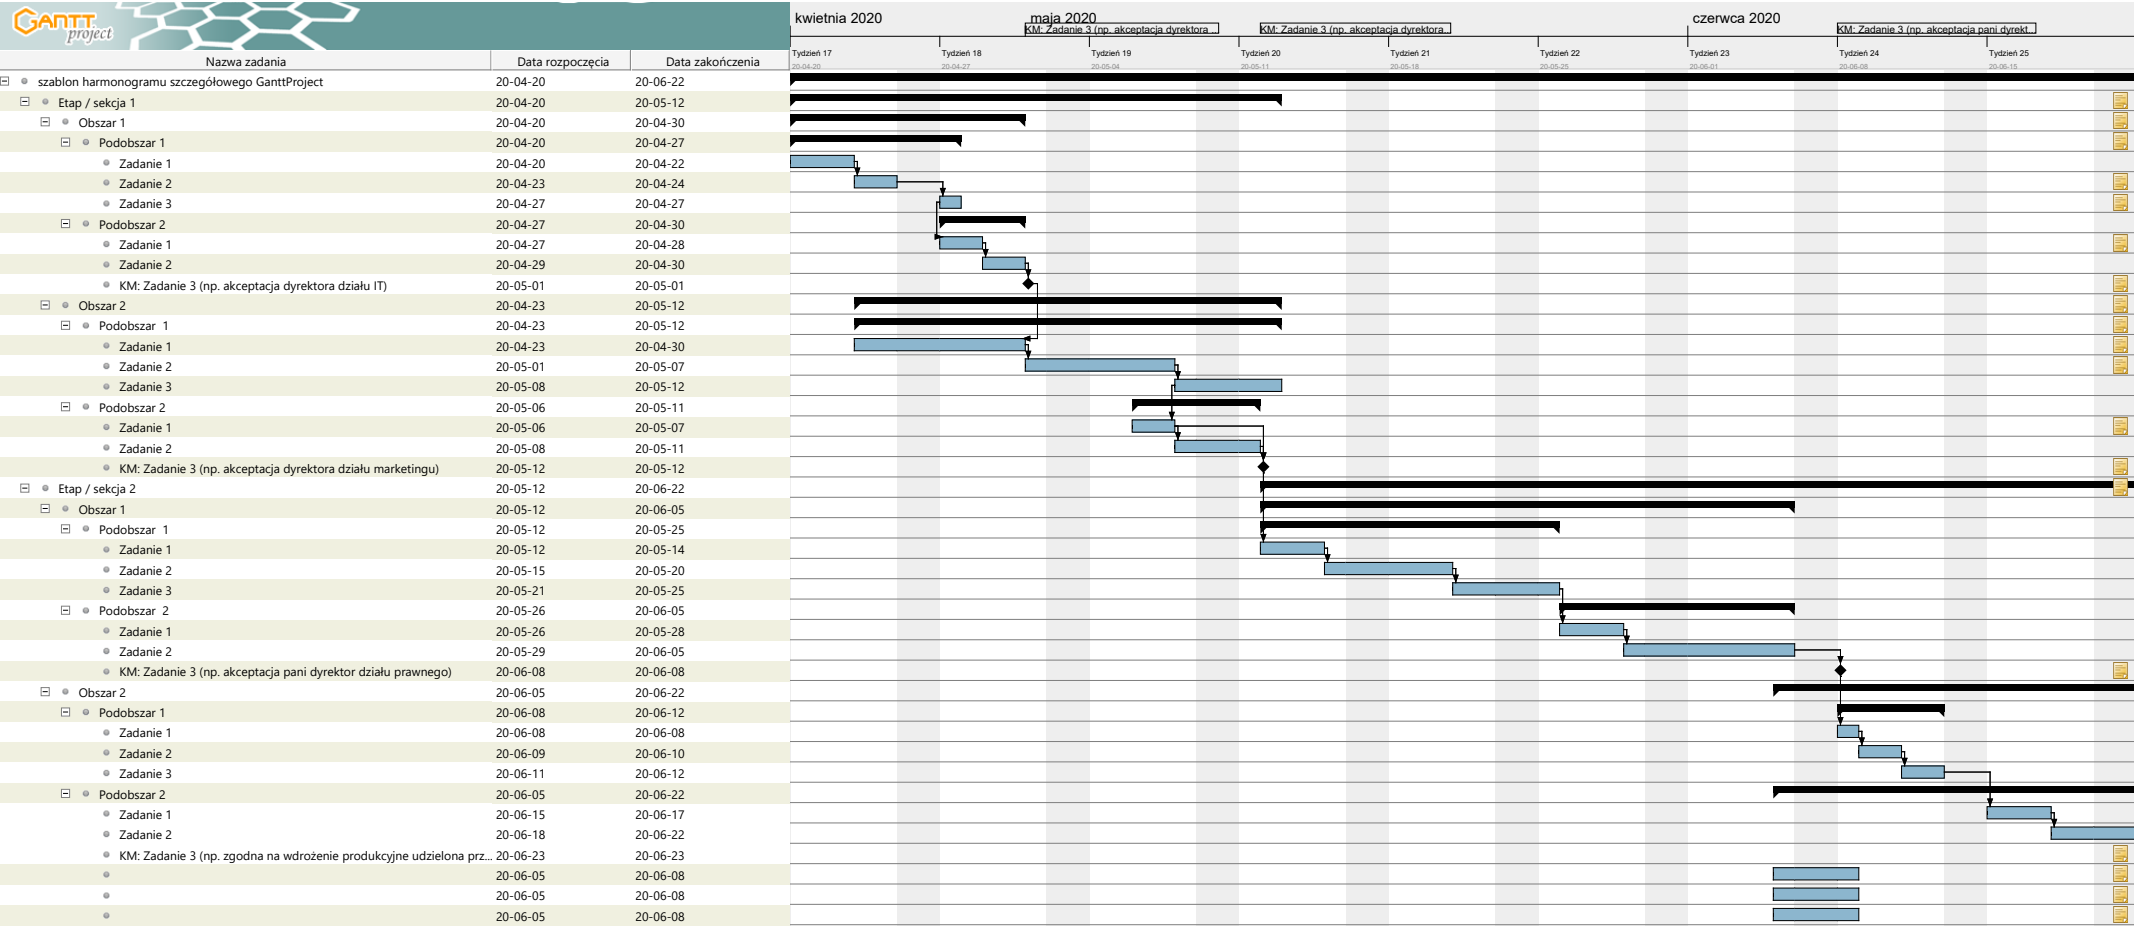


Diagram osób

