




































































Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Nazwy zasobów	16	19
1			Etap / sekcja 1	15,33 dn	pon, 20.04.20	pon, 11.05.20				
2			Obszar 1	9,33 dn	pon, 20.04.20	pią, 01.05.20				
3			Podobszar 1	5,5 dn	pon, 20.04.20	pon, 27.04.20				
4			Zadanie 1	3 dn	pon, 20.04.20	śro, 22.04.20		Jan Kowalski;Antek		
5			Zadanie 2	2 dn	czw, 23.04.20	pią, 24.04.20	4	Tomasz Nowak		
6			Zadanie 3	0,5 dn	pon, 27.04.20	pon, 27.04.20	5	Łukasz Zieliński		
7			Podobszar 2	4,33 dn	pon, 27.04.20	pią, 01.05.20				
8			Zadanie 1	2 dn	pon, 27.04.20	wto, 28.04.20	6RR	John Doe		
9			Zadanie 2	2 dn	śro, 29.04.20	czw, 30.04.20	8	Marek Kowalski		
10			<i>KM: Zadanie 3 (np. akceptacja dyrektora działu IT)</i>	<i>0,33 dn</i>	<i>pią, 01.05.20</i>	<i>pią, 01.05.20</i>	<i>9</i>	<i>Jarek Nowak</i>		
11			Obszar 2	11 dn	pią, 24.04.20	pon, 11.05.20				
12			Podobszar 1	11 dn	pią, 24.04.20	pon, 11.05.20				
13			Zadanie 1	5 dn	pią, 24.04.20	pią, 01.05.20	10ZZ	Adam Kowalik		
14			Zadanie 2	4 dn	pią, 01.05.20	czw, 07.05.20	13	Dawid Mielesz		
15			Zadanie 3	2 dn	czw, 07.05.20	pon, 11.05.20	14	Jan Długosz		
16			Podobszar 2	2,1 dn	śro, 06.05.20	pią, 08.05.20				
17			Zadanie 1	1 dzień	śro, 06.05.20	czw, 07.05.20	15RZ	Adam Mickiewicz		















Projekt: szablon harmonogram
Data: pią, 07.08.20




















Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			


Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Nazwy zasobów	16	19
18			Zadanie 2	1 dzień	czw, 07.05.20	pią, 08.05.20	17	Stefan Niecik		
19			<i>KM: Zadanie 3 (np. akceptacja dyrektora działu marketingu)</i>	<i>0,1 dn</i>	<i>pią, 08.05.20</i>	<i>pią, 08.05.20</i>	<i>18;17</i>	<i>John Smith</i>		
20			Etap / sekcja 2	27 dn?	pią, 08.05.20	wto, 16.06.20				
21			Obszar 1	18 dn	pią, 08.05.20	śro, 03.06.20				
22			Podobszar 1	7 dn	pią, 08.05.20	wto, 19.05.20				
23			Zadanie 1	2 dn	pią, 08.05.20	wto, 12.05.20	19	Daniel Juszczyk		
24			Zadanie 2	3 dn	wto, 12.05.20	pią, 15.05.20	23	Antek Kleks		
25			Zadanie 3	2 dn	pią, 15.05.20	wto, 19.05.20	24	Witold Jaroszewski		
26			Podobszar 2	11 dn	wto, 19.05.20	śro, 03.06.20				
27			Zadanie 1	2 dn	wto, 19.05.20	czw, 21.05.20	25	Wiesław Nalazek		
28			Zadanie 2	5 dn	czw, 21.05.20	czw, 28.05.20	27	Czesław Niemen		
29			<i>KM: Zadanie 3 (np. akceptacja pani dyrektor działu prawnego)</i>	<i>4 dn</i>	<i>czw, 28.05.20</i>	<i>śro, 03.06.20</i>	<i>28</i>	<i>Natalia Kruk</i>		
30			Obszar 2	9 dn?	śro, 03.06.20	wto, 16.06.20				
31			Podobszar 1	2 dn	śro, 03.06.20	pią, 05.06.20				
32			Zadanie 1	0,5 dn	śro, 03.06.20	śro, 03.06.20	29	Grzegorz Wątyły		
33			Zadanie 2	0,5 dn	śro, 03.06.20	czw, 04.06.20	32	Tomasz Czech		
34			Zadanie 3	1 dzień	czw, 04.06.20	pią, 05.06.20	33	Jan Kulczyk		
35			Podobszar 2	7 dn?	pią, 05.06.20	wto, 16.06.20				

Projekt: szablon harmonogram
Data: pię, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			


Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Nazwy zasobów	16		19
36			Zadanie 1	2 dn	pią, 05.06.20	wto, 09.06.20	34	Marta Caban			
37			Zadanie 2	2 dn	wto, 09.06.20	czw, 11.06.20	36	Jonasz Mielec			
38			<i>KM: Zadanie 3 (np. zgodna na wdrożenie produkcyjne udzielona przez członka zarządu)</i>	<i>3 dn</i>	<i>czw, 11.06.20</i>	<i>wto, 16.06.20</i>	<i>37</i>	<i>Jan Kuc</i>			
39											
40											
41											
42											
43											
44											

Projekt: szablon harmonogram Data: pię, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

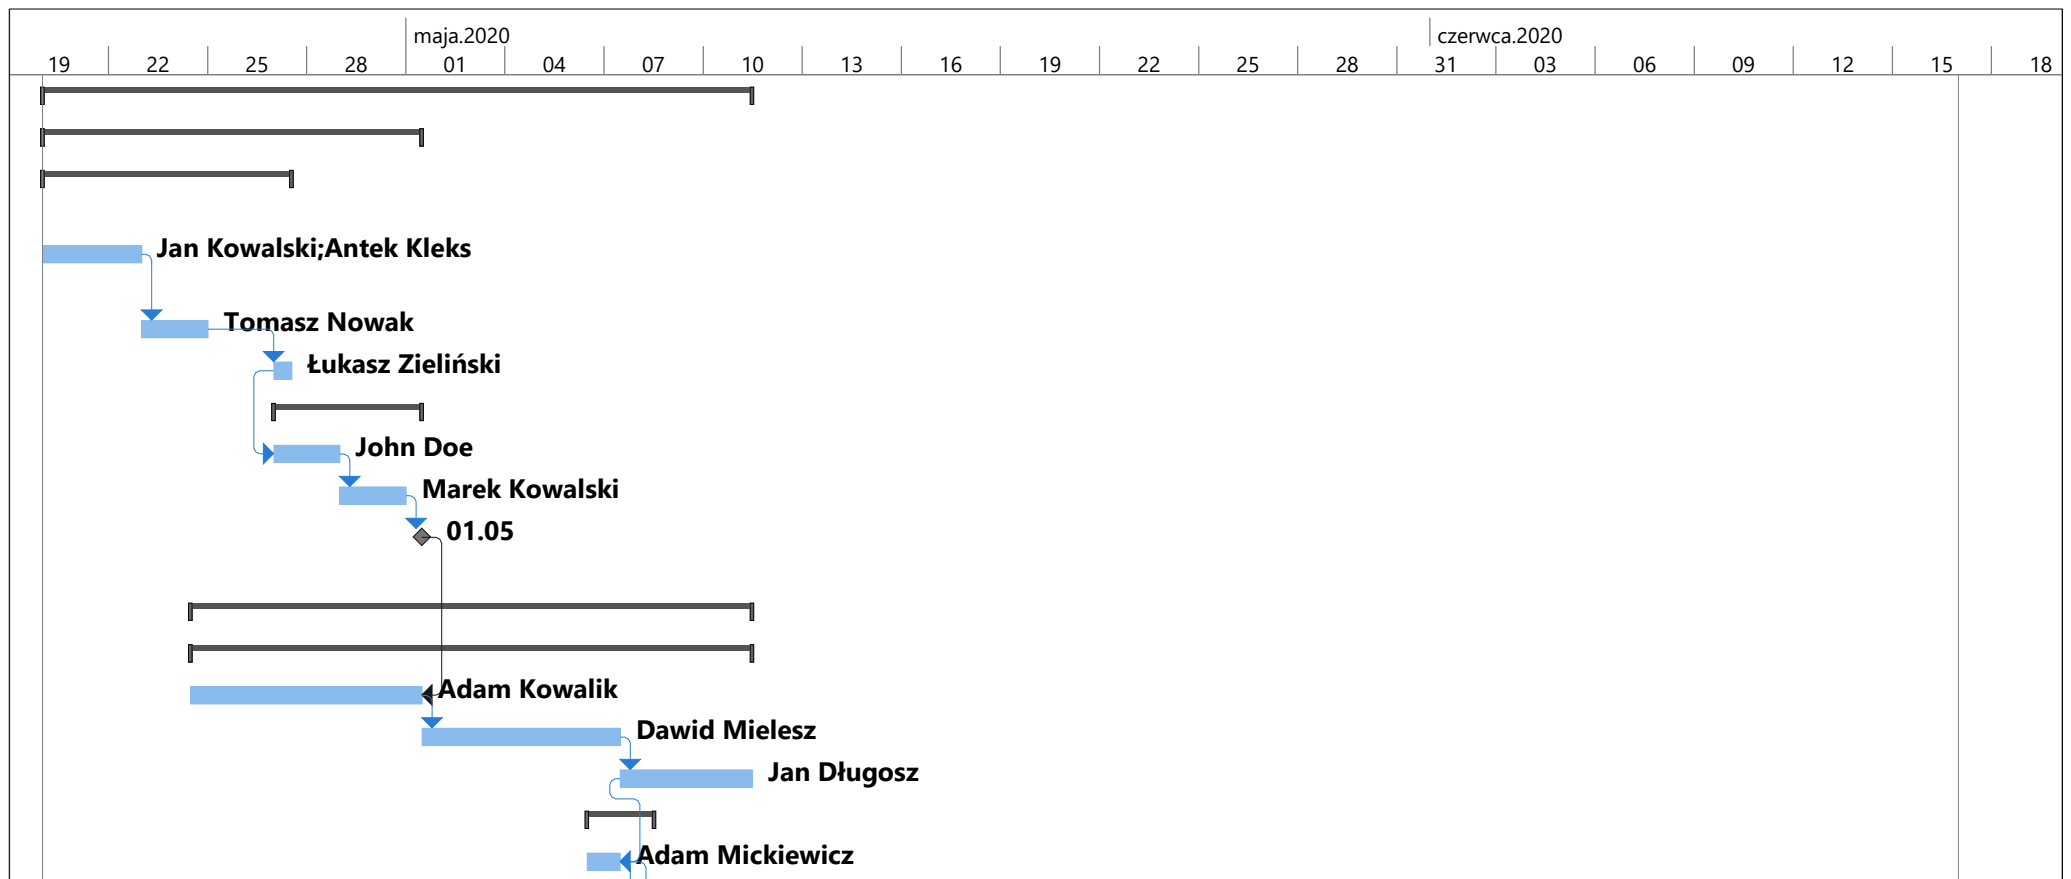

Projekt: szablon harmonogram
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

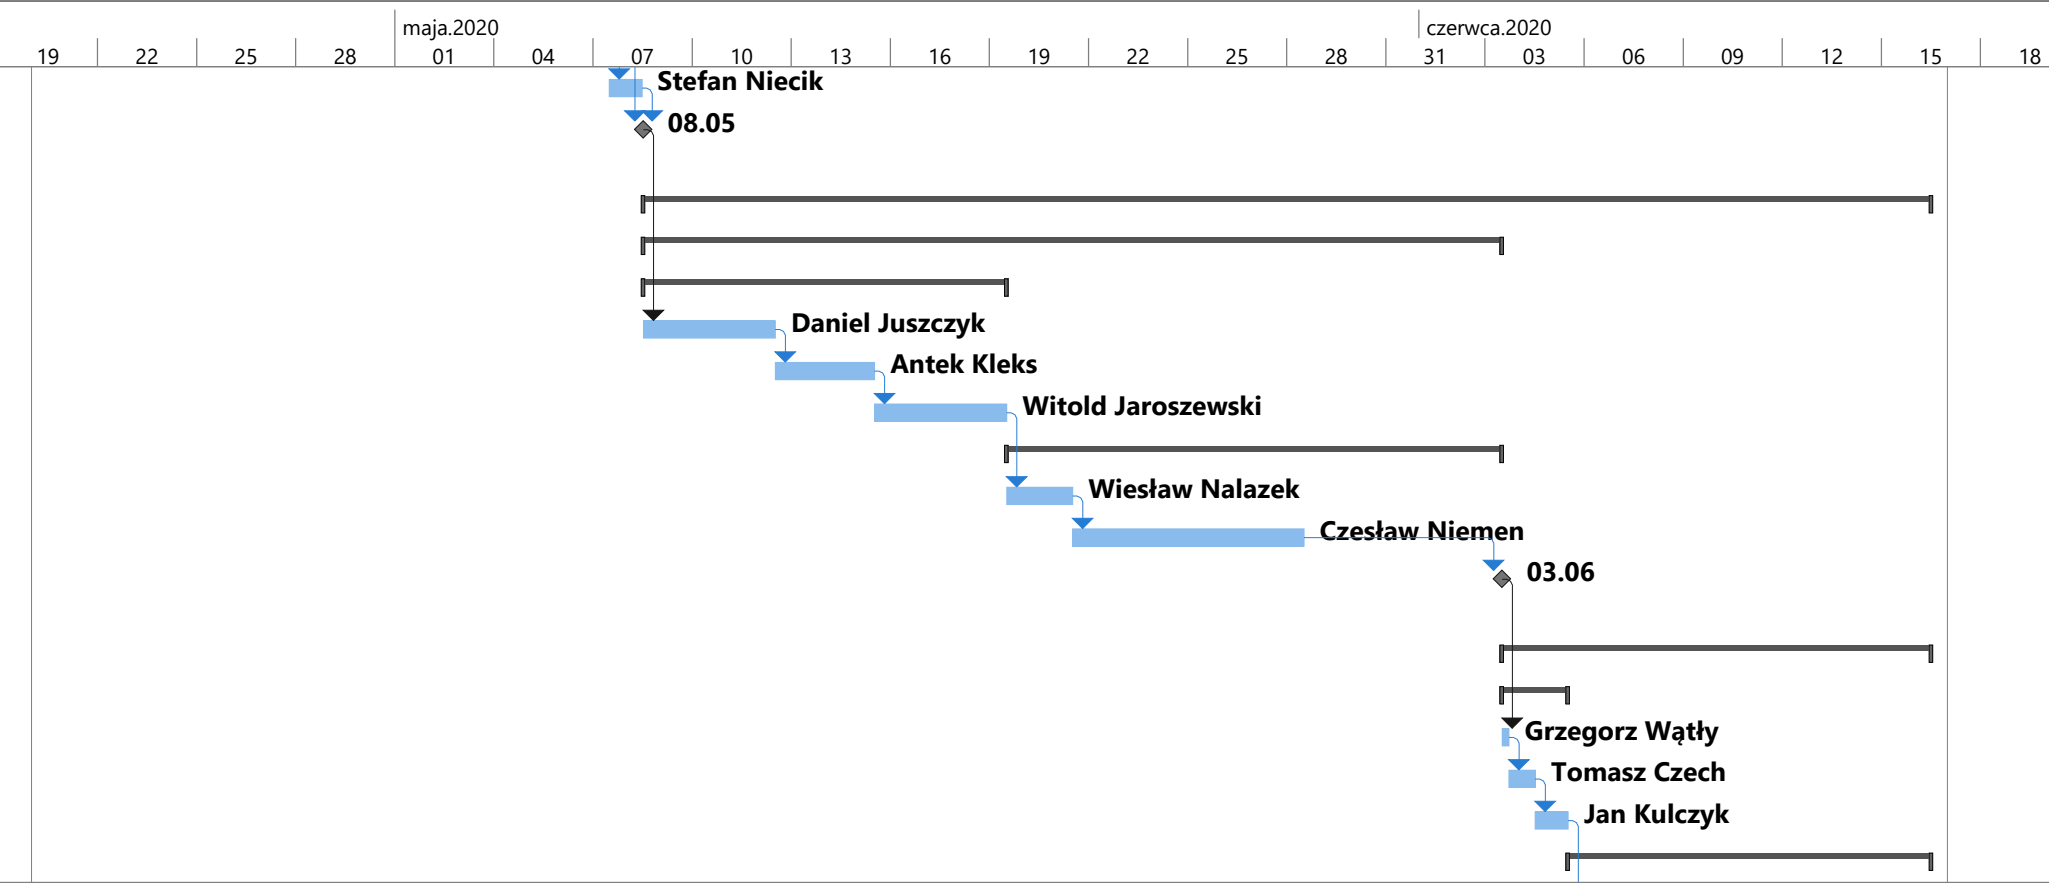

Projekt: szablon harmonogram
Data: pią, 07.08.20



Projekt: szablon harmonogram Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

